





IESA LIVING

Check List
Preparaciones de Instalaciones

24" / 30" / 36" Transitional / Professional Gas Cooktop
STANDARD INSTALLATION



COUNTERTOP CUTOUT

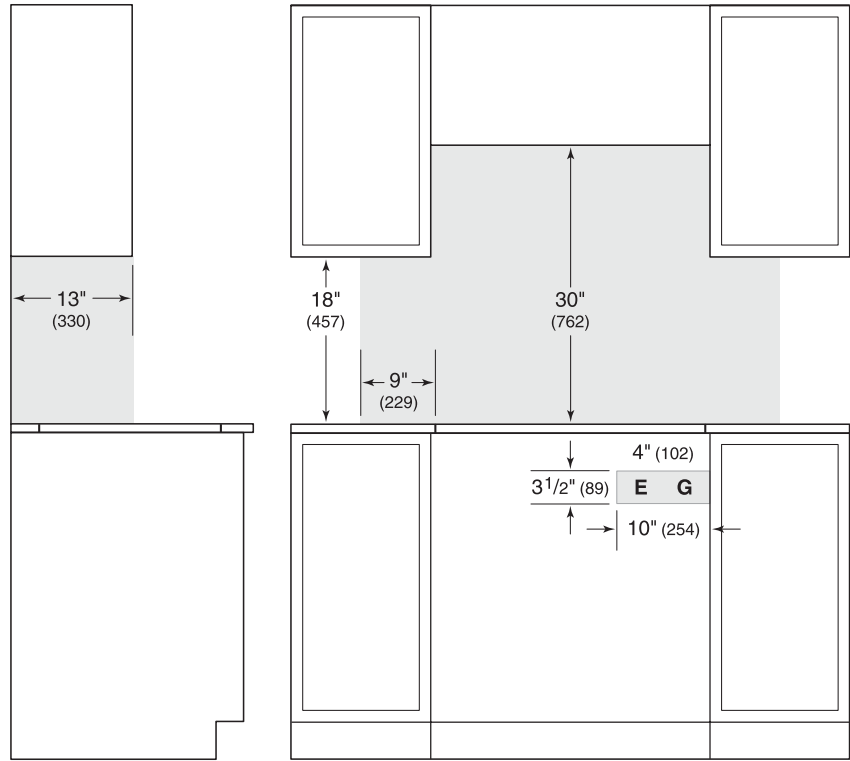

SIDE VIEW

FRONT VIEW

NICHO

- Ancho
- Alto
- Profundidad

¿CORRECTO?

Si	No
Si	No
Si	No

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Ubicación
- 120 VAC, 60 Hz
- Pastilla dedicada de 15 Amp
- Enchufe con tierra física
- Tierra física conectada
- Conducto de 6' (1.8 m)
- Tipo de puesta a tierra de 3 clavijas

Si	No
Si	No
Si	No
Si	No
Si	No
Si	No
Si	No

INSTALACIÓN GAS

- Ubicación
- Suministro de gas Línea ID de 3/4 "
- Entrada de gas 1/2 "NPT macho

Si	No
Si	No
Si	No

GAS NATURAL

- Presión de suministro 5 "(12,5 mb)
- Presión de línea mínima 7 "(17,5 mb)
- Presión máxima del regulador 14 "(34,9 mb), 0,5 psi (3,5 kPa)

Si	No
Si	No
Si	No

GAS LP

- Presión de suministro 10 "(25 mb)
- Presión de línea mínima 11 "(27,4 mb)
- Presión máxima del regulador 14 "(34,9 mb), 0,5 psi (3,5 kPa)

Si	No
Si	No
Si	No

¿Se puede instalar la Unidad?

Si	No
----	----

CUTOUT WIDTH

W

24" Transitional	23" (584)
30" Transitional/Professional	29" (737)
36" Transitional/Professional	35" (889)

Fecha de Inspeccion
Tecnico
CAS (Taller)

Firma

--
