




IESA LIVING

Check List
Preparaciones de Instalaciones

Module Cooktops

Gas / Multifunction Module
STANDARD INSTALLATION

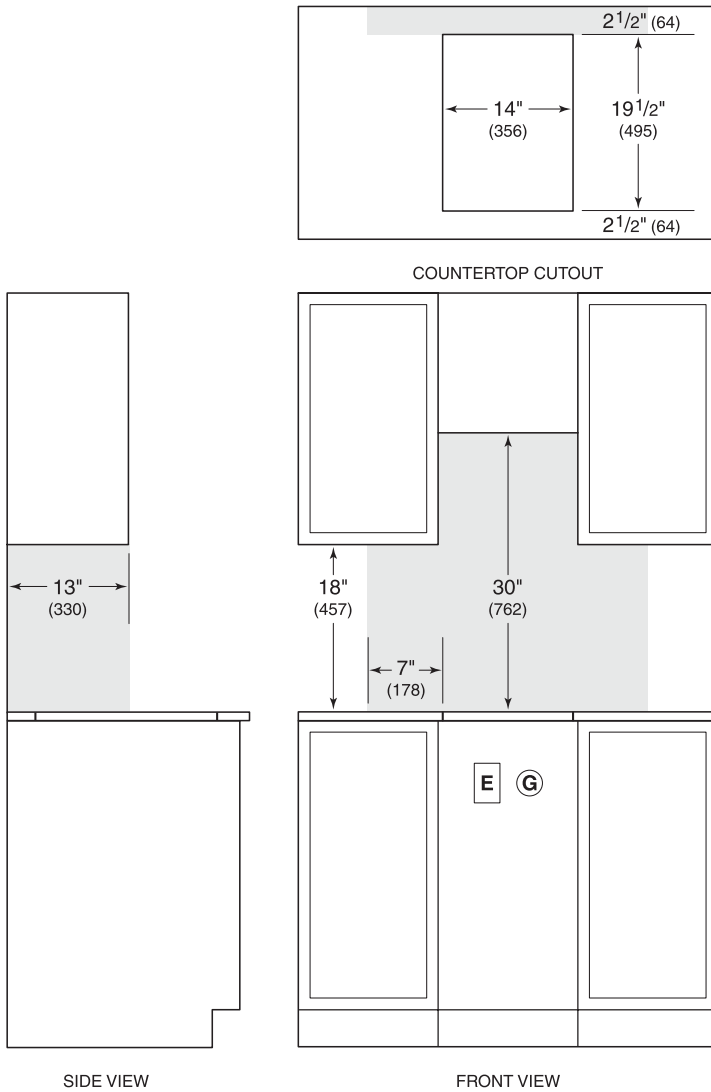

NOTE: Shaded area above countertop indicates minimum clearance to combustible surfaces, combustible materials cannot be located within this area.

		¿CORRECTO?	
NICHO			
Ancho		Si	No
Alto		Si	No
Profundidad		Si	No
INSTALACIÓN ELÉCTRICA			
Ubicación		Si	No
120 VAC, 50/60 Hz		Si	No
Pastilla dedicada de 15 Amp		Si	No
Enchufe con tierra física		Si	No
Tierra física conectada		Si	No
Conducto de 6' (1.8 m)		Si	No
Tipo de puesta a tierra de 3 clavijas		Si	No

INSTALACIÓN GAS			
Ubicación		Si	No
Suministro de gas Línea ID de 3/4 "		Si	No
Entrada de gas 1/2 "NPT macho		Si	No
GAS NATURAL			
Presión de suministro 5 "(12,5 mb)		Si	No
Presión de línea mínima 7 "(17,5 mb)		Si	No
Presión máxima del regulador 14 "(34,9 mb), 0,5 psi (3,5 kPa)		Si	No
GAS LP			
Presión de suministro 10 "(25 mb)		Si	No
Presión de línea mínima 11 "(27,4 mb)		Si	No
Presión máxima del regulador 14 "(34,9 mb), 0,5 psi (3,5 kPa)		Si	No

¿Se puede instalar la Unidad? Si No

Fecha de Inspeccion
 Tecnico
 CAS (Taller)

Firma
