


Check List  
Preparaciones de Instalaciones

Cup Warming Drawer  
FLUSH INSET INSTALLATION

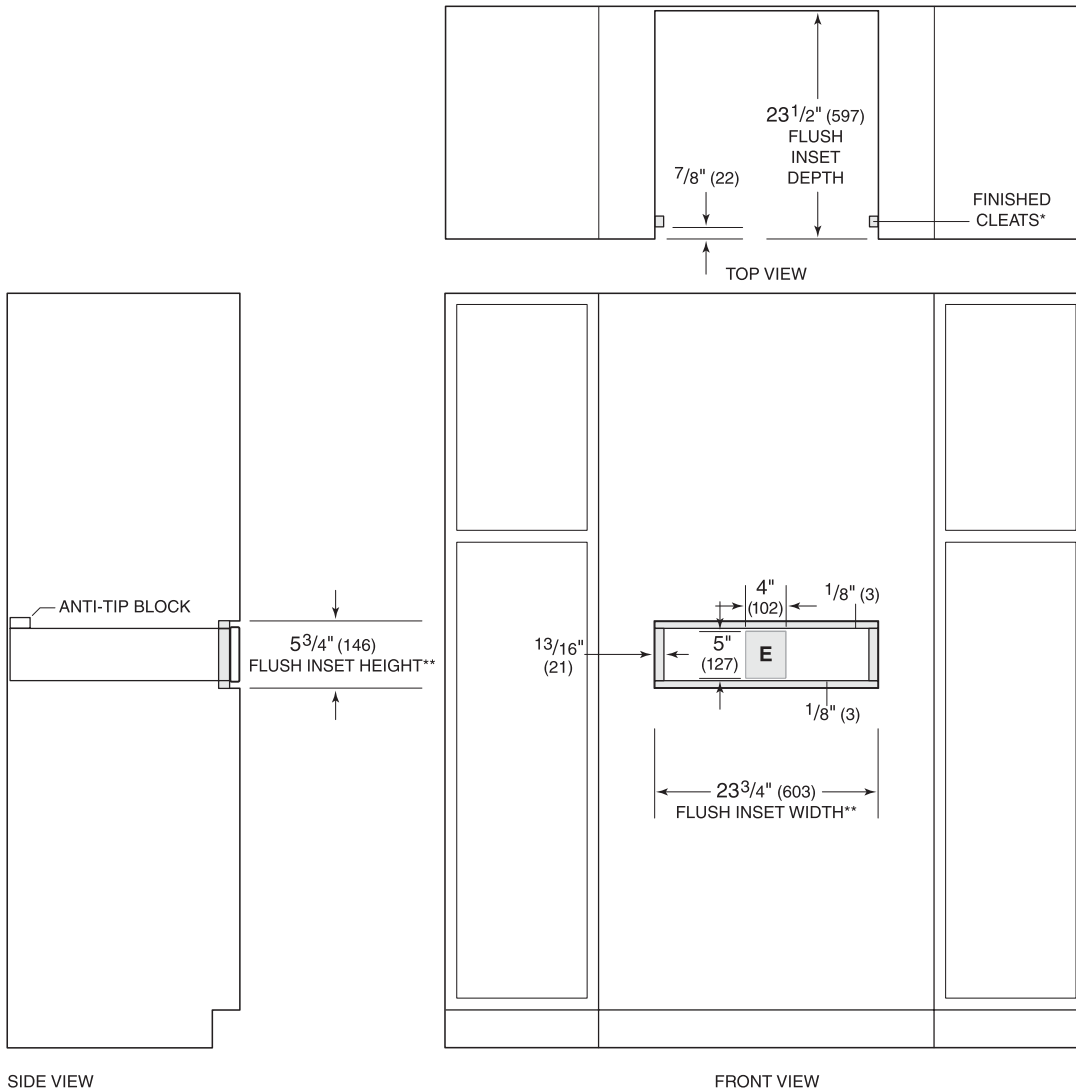

\*Will be visible and should be finished to match cabinetry.  
 \*\*Dimension provides minimum reveals.

**NICHO** **¿CORRECTO?**

Ancho	Si	No
Alto	Si	No
Profundidad	Si	No

**INSTALACIÓN ELÉCTRICA**

Ubicación	Si	No
120 VAC, 60 Hz	Si	No
Pastilla dedicada de 10 Amp	Si	No
Enchufe con tierra física	Si	No
Tierra física conectada	Si	No
Conducto de 3' (0.9 m)	Si	No
Tipo de puesta a tierra de 3 clavijas	Si	No

**INSTALLATION REQUIREMENTS**

<b>BASE SUPPORT</b>	<b>MIN</b>
Cup Warming Drawer	75 lb (34 kg)
<b>TRIM OVERLAP</b>	
Top	0" (0)
Bottom	0" (0)
Sides	1 1/16" (18)

¿Se puede instalar la Unidad? 

Si	No
----	----

Fecha de Inspeccion 

--

  
 Tecnico 

--

  
 CAS (Taller) 

--

Firma 

--
