


Check List
Preparaciones de Instalaciones

Cup Warming Drawer
STANDARD INSTALLATION

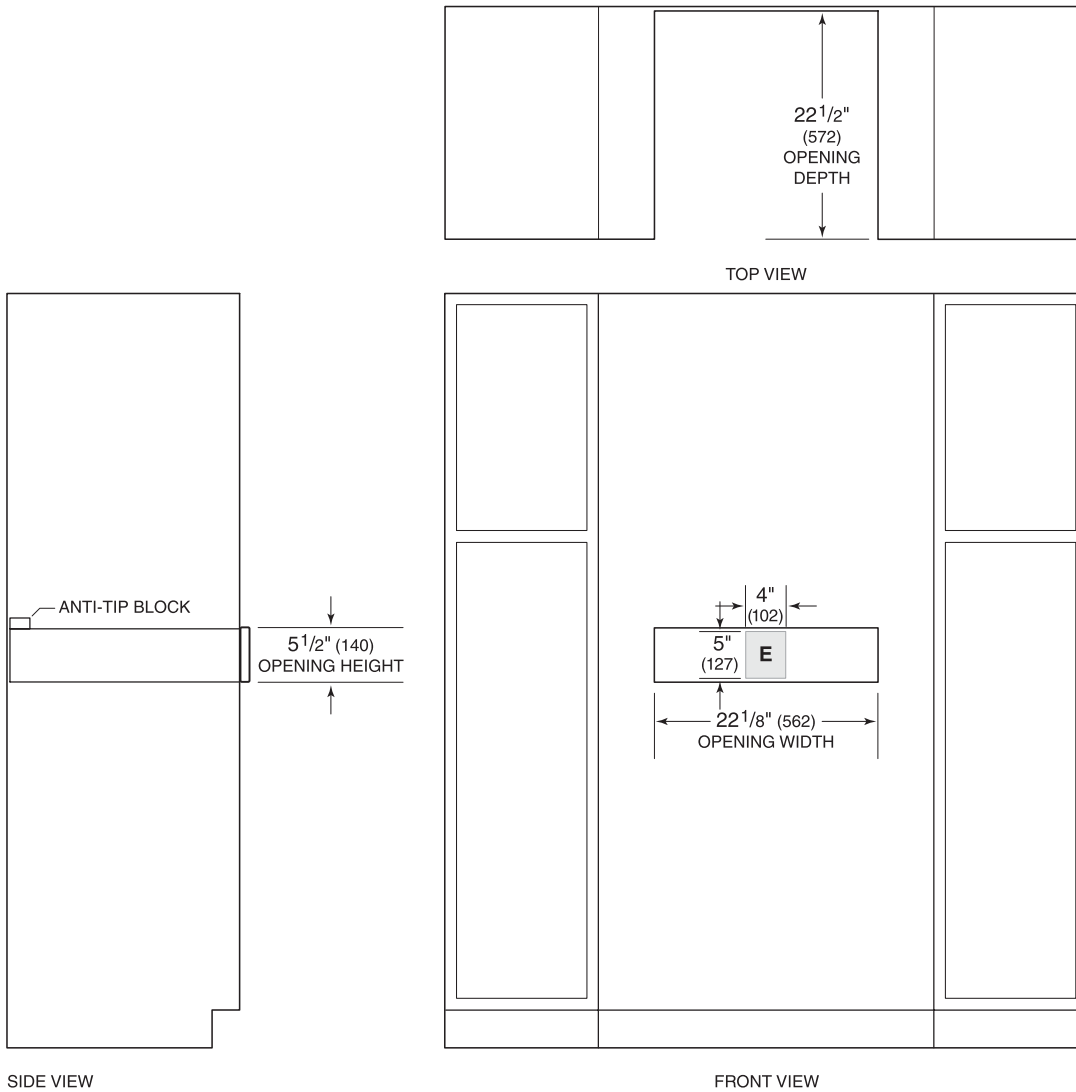

SIDE VIEW

FRONT VIEW

NICHO

- Ancho
- Alto
- Profundidad

¿CORRECTO?

Si	No
Si	No
Si	No

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

- Ubicación
- 120 VAC, 60 Hz
- Pastilla dedicada de 10 Amp
- Enchufe con tierra física
- Tierra física conectada
- Conducto de 3' (0.9 m)
- Tipo de puesta a tierra de 3 clavijas

Si	No
Si	No
Si	No
Si	No
Si	No
Si	No
Si	No

INSTALLATION REQUIREMENTS

BASE SUPPORT

Cup Warming Drawer **MIN** 75 lb (34 kg)

TRIM OVERLAP

Top 0" (0)
Bottom 0" (0)
Sides 1 1/16" (18)

¿Se puede instalar la Unidad?

Si	No
----	----

Fecha de Inspeccion

Tecnico

CAS (Taller)

Firma
